Análise quantitativa de contratos e obras - Prefeitura Municipal de Vitória/ES

Contratos de 2025 e 2026: valores iniciais, aditivos, execução financeira (empenhado, liquidado e pago), limites legais, licitação (PNCP) e termos (TCE-ES). Documento com valores numéricos e cálculos, sem juízo de valor.

1. Dados e método

Fonte	Conteúdo usado
Portal da Transparência de Vitória (Contratos 2025/2026 + IPAMV e CDTIV)	1065 contratos consolidados, sendo 101 com TipoContrato = Obra. Valor contratado, aditivo acumulado, valor total, fornecedor, secretaria, datas e objeto.
Painel de Obras da PMV (Obras-2025/2026.csv)	179 obras cadastradas (2021-2026), sendo 40 casadas com contratos de 2025-2026. Traz Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Estágio e Bairros.
PNCP (API de consulta)	1.287 licitações de Vitória (2025 a 16/10/2026). Cruzamento pelo número do processo: 794 contratos com licitação (62 obras).
TCE-ES (dados abertos, CidadES Contratações)	Instrumentos, termos de alteração e medições/pagamentos. Cruzamento por número/ano e CNPJ: 643 contratos (19 obras).

Cálculos: Variação (R$) = valor total - valor contratado; Variação % = variação (R$) / valor contratado x 100. Limite legal aplicado às obras: 25% do valor inicial, ou 50% quando o objeto é reforma (Lei 14.133, art. 125). **Outlier:** contrato 300/2025 (aditivo de R$ 2.139.480.000,00 sobre R$ 2.139.480,00 contratados, 100.000%), apresentado à parte nas tabelas "sem outlier".

2. Totais e variação (R$)

Grupo	n	Valor inicial	Aditivos	Valor atual	Var. %	Com aditivo	Supressões
Todos	1065	1.011.430.558,80	2.246.945.642,73	3.258.376.201,53	222,16	141	6
Todos sem outlier	1064	1.009.291.078,80	107.465.642,73	1.116.756.721,53	10,65	140	6
Obras	101	545.988.525,59	14.161.570,88	560.150.096,47	2,59	21	1
Serviço	747	325.379.149,19	2.227.861.525,45	2.553.240.674,64	684,70	95	1
Material	154	93.400.000,30	4.568.307,11	97.968.307,41	4,89	20	3
Outros	55	45.364.904,12	354.239,29	45.719.143,41	0,78	5	1


3. Estatística descritiva

Métrica	Contratado (sem outlier)	Aditivo (sem outlier)	% aditivo (sem outlier)	Contratado (obras)	Aditivo (obras)	% aditivo (obras)
n	1.064	1.064	1.049	101	101	101
Média	948.581,84	101.001,54	8,92	5.405.826,99	140.213,57	8,00
Mediana	51.678,16	0,00	0,00	1.478.344,72	0,00	0,00
Desvio padrão	4.526.535,04	1.206.314,71	33,24	12.529.372,34	522.915,49	23,66
Mínimo	0,00	-1.470.524,90	-100,00	4.220,00	-1.470.524,90	-19,08
Máximo	97.850.000,00	37.066.735,98	567,12	97.850.000,00	3.805.622,32	150,51

Considerando só contratos com aditivo positivo: todos sem outlier, n=140, média 67,88%, mediana 77,46%; obras, n=21, média 39,37%, mediana 24,94%.

4. Obras, limite legal e execução financeira (Empenhado / Pago)

Das 101 obras: 21 têm aditivo positivo, 1 tem supressão, **5 estão acima do limite aplicado** e 8 ficam entre 20% e o limite.

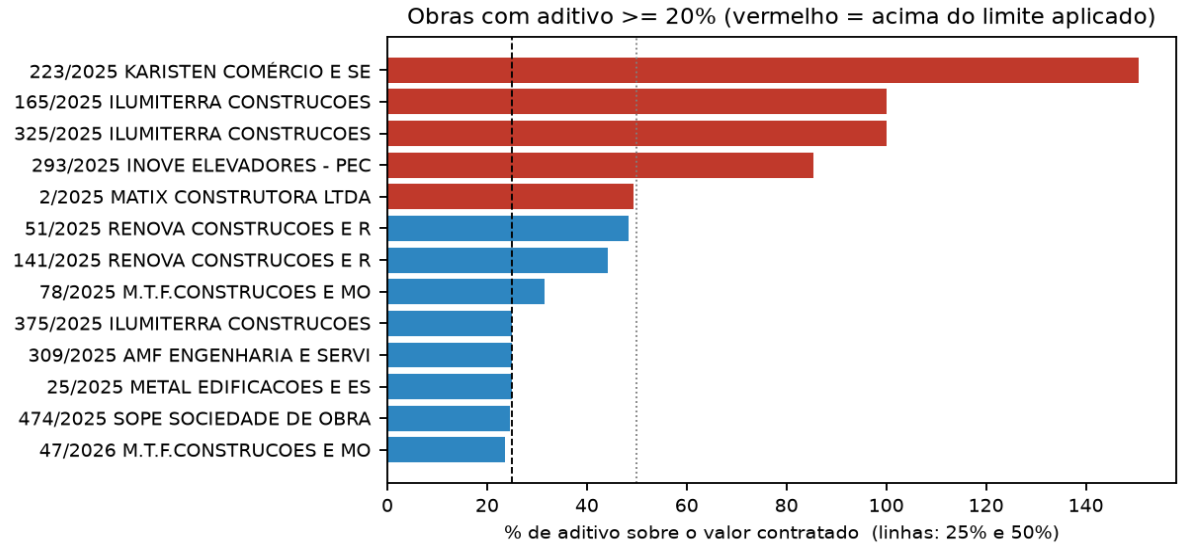

Contrato	Fornecedor / Subcategoria	Inicial	Aditivo	%	Lim.	Acima?	Empenhado	Pago
223/2025	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS (Instalações, Tecnologia,)	529.999,44	797.724,20	150,51	25%	Sim	-	-
165/2025	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MON (Manutenção e Conservação)	3.805.622,32	3.805.622,32	100,00	50%	Sim	-	-
325/2025	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MON (Instalações, Tecnologia,)	1.478.344,72	1.478.344,72	100,00	25%	Sim	-	-
293/2025	INOVE ELEVADORES - PECAS E S (Instalações, Tecnologia,)	4.220,00	3.600,00	85,31	25%	Sim	-	150,00
2/2025	MATIX CONSTRUTORA LTDA (Urbanização, Praças e In)	904.000,00	445.915,50	49,33	25%	Sim	1.480.733,33	1.480.733,33
51/2025	RENOVA CONSTRUCOES E REFORMA (Urbanização, Praças e In)	2.864.000,00	1.384.783,45	48,35	50%	Não	3.862.534,90	1.855.549,35
141/2025	RENOVA CONSTRUCOES E REFORMA (Reforma Elétrica e Clima)	558.208,00	246.938,61	44,24	50%	Não	808.283,25	586.823,14
78/2025	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGEN (Construção, Reforma e Am)	1.198.292,00	376.845,76	31,45	50%	Não	1.659.195,28	1.659.195,28
375/2025	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MON (Manutenção e Conservação)	400.000,00	100.000,00	25,00	25%	Não	-	-
309/2025	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LT (Urbanização, Praças e In)	684.831,30	170.828,61	24,94	25%	Não	846.703,75	846.703,75
25/2025	METAL EDIFICACOES E ESTRUTUR (Urbanização, Praças e In)	1.499.000,00	373.817,66	24,94	25%	Não	2.018.979,03	2.018.979,03
474/2025	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PR (Contenção de Encostas e)	2.403.760,64	590.881,77	24,58	25%	Não	2.238.662,40	2.238.662,40
47/2026	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGEN (Reconstrução e Melhorias)	6.237.395,15	1.470.524,90	23,58	25%	Não	1.462.469,06	205.962,89

Mapeamento por Subcategoria do Objeto (101 contratos classificados como Obra):

Subcategoria do Objeto	n	Valor Inicial	Aditivos	Var. %	Com adit.	Empenhado (Painel)	Pago (Painel)
Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Públicos	19	195.466.591,48	1.453.183,14	0,74	3	40.658.952,72	23.632.815,90
Urbanização, Praças e Infraestrutura Viária	19	140.765.062,19	3.685.778,06	2,62	7	26.396.689,76	16.359.013,41
Projetos, Estudos e Consultoria de Engenharia	15	10.489.073,08	0,00	0,00	0	-	-

Subcategoria do Objeto	n	Valor Inicial	Aditivos	Var. %	Com adit.	Empenhado (Painel)	Pago (Painel)
Instalações, Tecnologia, Elevadores e Iluminação	13	21.538.928,45	2.580.681,13	11,98	5	-	-
Manutenção e Conservação Predial	10	65.658.479,10	3.905.622,32	5,95	2	-	-
Reforma Elétrica e Climatização Predial	7	9.612.781,83	246.938,61	2,57	1	6.942.274,14	4.947.689,99
Contenção de Encostas e Drenagem	5	19.675.977,92	2.289.367,62	11,64	2	18.010.135,32	13.252.729,48
Manutenção de Vias, Calçadas e Drenagem	5	45.000.000,00	0,00	0,00	0	-	-
Outros Serviços Cadastrados como Obra (Poda, Resíduos, Eventos)	4	1.374.331,13	0,00	0,00	0	-	-
Reconstrução e Melhorias Habitacionais	4	36.407.300,41	0,00	0,00	1	7.719.830,80	3.627.423,71


5. Discrepâncias matemáticas e cruzamento com o Painel de Obras

Verificação	Resultado
Valor contratado + aditivo diferente de valor total (tolerância R$ 0,01)	0 contratos
Valor contratado menor ou igual a zero	15 contratos
Aditivo maior que o valor contratado (> 100%)	45 contratos
Obras (2025-2026) localizadas no Painel de Obras da PMV	40 de 101 obras (Empenhado: R$ 99.727.882,74 | Pago: R$ 61.819.672,49)
Obras em que o Valor Empenhado supera o Valor Total (Inicial + Aditivo)	14 obras
Valor inicial PMV igual ao TCE-ES (contratos casados)	643 de 643
Aditivo > 0 na PMV e nenhum termo no TCE-ES (contratos casados)	9 contratos

6. Licitação (PNCP) e contrato

Desconto da licitação = (valor estimado - valor homologado) / valor estimado.

Grupo	n	Média %	Mediana %	Desvio %	Mín %	Máx %	Contr. > homolog.	Atual > homolog.
Todos	720	10,47	0,00	22,76	-125,00	93,01	3	32
Obras	34	12,58	4,62	14,03	0,00	43,72	0	4

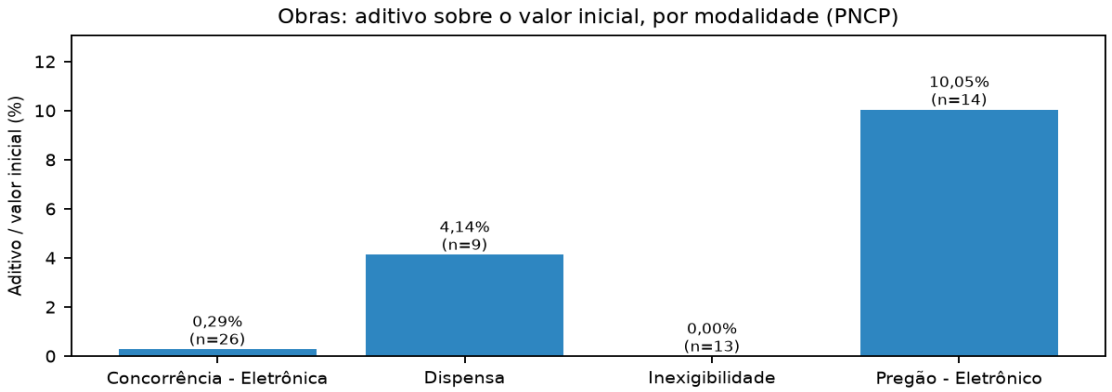


Modalidade (todos, sem outlier)	n	Valor inicial	Aditivo	Aditivo/inicial %	Com aditivo
Concorrência - Eletrônica	28	158.483.746,92	452.959,01	0,29	3
Dispensa	94	54.343.376,06	2.625.731,66	4,83	15
Inexigibilidade	431	47.315.925,43	13.311.121,98	28,13	14
Pregão - Eletrônico	238	237.770.157,03	10.999.943,71	4,63	34
Pregão - Presencial	2	588.000,00	0,00	0,00	0

7. Termos e pagamentos (TCE-ES, apenas contratos casados)

Indicador	Valor
Contratos com termo de alteração	57
Termos aditivos / apostilamentos	51 / 20
Prorrogações de prazo	26
Acréscimos ou supressões quantitativas	11
Reequilíbrios econômico-financeiros	7
Contratos com pagamento registrado no TCE-ES / total pago (R$)	245 / 55.563.054,66

8. Aditivos por secretaria / entidade

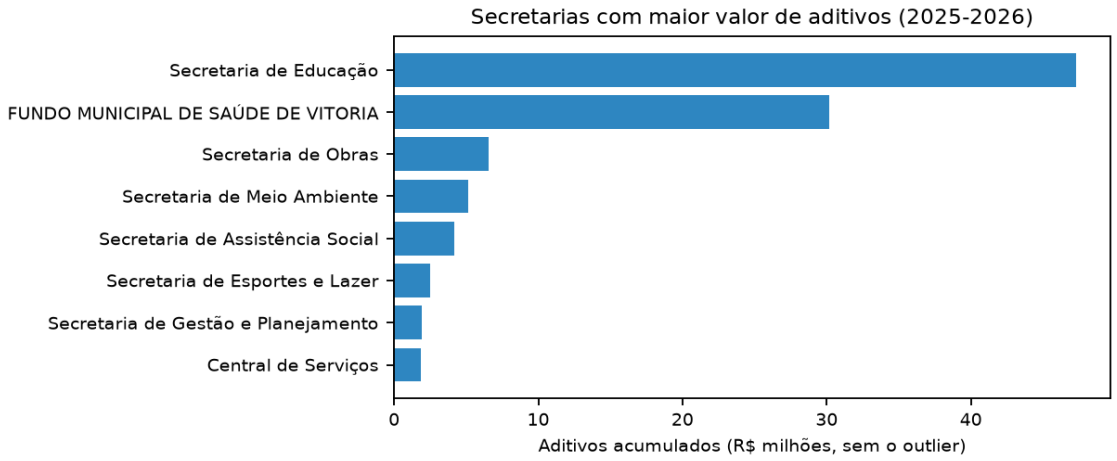

Secretaria / Entidade (sem outlier)	n	Valor inicial	Aditivo	Aditivo/inicial %	Com aditivo
Secretaria de Educação	43	123.790.944,68	47.284.794,27	38,20	17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA	107	151.642.825,51	30.165.127,78	19,89	30
Secretaria de Obras	59	352.922.215,29	6.554.812,01	1,86	14
Secretaria de Meio Ambiente	15	19.655.922,26	5.115.932,81	26,03	4
Secretaria de Assistência Social	18	6.582.823,31	4.198.038,06	63,77	5
Secretaria de Esportes e Lazer	32	5.885.148,27	2.507.504,07	42,61	7
Secretaria de Gestão e Planejamento	50	19.126.072,86	1.906.334,21	9,97	9
Central de Serviços	27	66.523.009,43	1.828.691,90	2,75	2
Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Ur	17	36.663.644,77	1.706.530,48	4,65	3
Secretaria de Cultura	350	20.330.328,46	1.376.357,91	6,77	5
Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação	32	7.731.255,01	1.191.683,18	15,41	3
Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho	36	3.752.870,68	881.597,98	23,49	6

9. Limitações

• O Painel de Obras da PMV traz Valor Empenhado, Liquidado e Pago para 40 das 101 obras de 2025-2026 (e mais 139 obras de 2021-2024 salvas em painel_obras_pmv_2021_2026.csv).

• Obras = campo TipoContrato 'Obra' da própria base. Há itens de tecnologia, manutenção e eventos nessa classificação (mapeados na Subcategoria do Objeto).

• Reforma identificada pelo campo do TCE-ES ou pela palavra 'reforma' no objeto; pode haver erros.

• O limite de 25% foi aplicado apenas às obras. Serviços contínuos têm regras próprias.
