# Análise quantitativa de contratos e obras - Prefeitura Municipal de Vitória/ES

Contratos de 2025 e 2026: valores iniciais, aditivos, execução financeira (empenhado, liquidado e pago), limites legais, licitação (PNCP) e termos (TCE-ES). Documento com valores numéricos e cálculos, sem juízo de valor.

## 1. Dados e método

| Fonte | Conteúdo usado |
|---|---|
| Portal da Transparência de Vitória (Contratos 2025/2026 + IPAMV e CDTIV) | 1065 contratos consolidados, sendo 101 com TipoContrato = Obra. Valor contratado, aditivo acumulado, valor total, fornecedor, secretaria, datas e objeto. |
| Painel de Obras da PMV (Obras-2025/2026.csv) | 179 obras cadastradas (2021-2026), sendo 40 casadas com contratos de 2025-2026. Traz Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Estágio e Bairros. |
| PNCP (API de consulta) | 1.287 licitações de Vitória (2025 a 16/10/2026). Cruzamento pelo número do processo: 794 contratos com licitação (62 obras). |
| TCE-ES (dados abertos, CidadES Contratações) | Instrumentos, termos de alteração e medições/pagamentos. Cruzamento por número/ano e CNPJ: 643 contratos (19 obras). |

**Cálculos:** Variação (R$) = valor total - valor contratado; Variação % = variação (R$) / valor contratado x 100. Limite legal aplicado às obras: 25% do valor inicial, ou 50% quando o objeto é reforma (Lei 14.133, art. 125). **Outlier:** contrato 300/2025 (aditivo de R$ 2.139.480.000,00 sobre R$ 2.139.480,00 contratados, 100.000%), apresentado à parte nas tabelas "sem outlier".

## 2. Totais e variação (R$)

| Grupo | n | Valor inicial | Aditivos | Valor atual | Var. % | Com aditivo | Supressões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 1065 | 1.011.430.558,80 | 2.246.945.642,73 | 3.258.376.201,53 | 222,16 | 141 | 6 |
| Todos sem outlier | 1064 | 1.009.291.078,80 | 107.465.642,73 | 1.116.756.721,53 | 10,65 | 140 | 6 |
| Obras | 101 | 545.988.525,59 | 14.161.570,88 | 560.150.096,47 | 2,59 | 21 | 1 |
| Serviço | 747 | 325.379.149,19 | 2.227.861.525,45 | 2.553.240.674,64 | 684,70 | 95 | 1 |
| Material | 154 | 93.400.000,30 | 4.568.307,11 | 97.968.307,41 | 4,89 | 20 | 3 |
| Outros | 55 | 45.364.904,12 | 354.239,29 | 45.719.143,41 | 0,78 | 5 | 1 |


## 3. Estatística descritiva

| Métrica | Contratado (sem outlier) | Aditivo (sem outlier) | % aditivo (sem outlier) | Contratado (obras) | Aditivo (obras) | % aditivo (obras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 1.064 | 1.064 | 1.049 | 101 | 101 | 101 |
| Média | 948.581,84 | 101.001,54 | 8,92 | 5.405.826,99 | 140.213,57 | 8,00 |
| Mediana | 51.678,16 | 0,00 | 0,00 | 1.478.344,72 | 0,00 | 0,00 |
| Desvio padrão | 4.526.535,04 | 1.206.314,71 | 33,24 | 12.529.372,34 | 522.915,49 | 23,66 |
| Mínimo | 0,00 | -1.470.524,90 | -100,00 | 4.220,00 | -1.470.524,90 | -19,08 |
| Máximo | 97.850.000,00 | 37.066.735,98 | 567,12 | 97.850.000,00 | 3.805.622,32 | 150,51 |

Considerando só contratos com aditivo positivo: todos sem outlier, n=140, média 67,88%, mediana 77,46%; obras, n=21, média 39,37%, mediana 24,94%.

## 4. Obras, limite legal e execução financeira (Empenhado / Pago)

Das 101 obras: 21 têm aditivo positivo, 1 tem supressão, **5 estão acima do limite aplicado** e 8 ficam entre 20% e o limite.

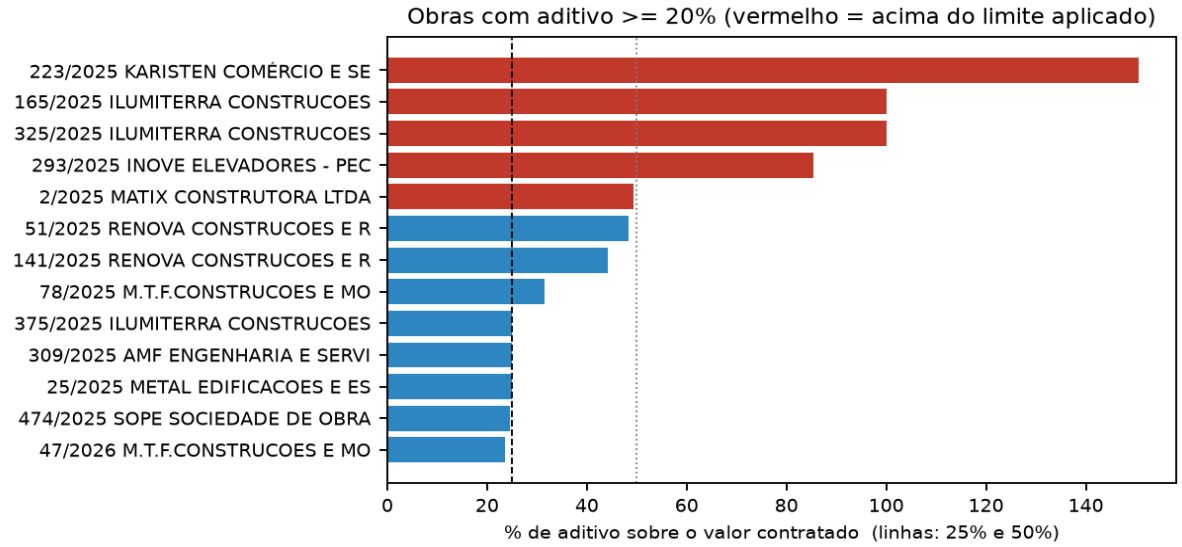


| Contrato | Fornecedor / Subcategoria | Inicial | Aditivo | % | Lim. | Acima? | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223/2025 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS (Instalações, Tecnologia,) | 529.999,44 | 797.724,20 | 150,51 | 25% | Sim | - | - |
| 165/2025 | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MON (Manutenção e Conservação) | 3.805.622,32 | 3.805.622,32 | 100,00 | 50% | Sim | - | - |
| 325/2025 | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MON (Instalações, Tecnologia,) | 1.478.344,72 | 1.478.344,72 | 100,00 | 25% | Sim | - | - |
| 293/2025 | INOVE ELEVADORES - PECAS E S (Instalações, Tecnologia,) | 4.220,00 | 3.600,00 | 85,31 | 25% | Sim | - | 150,00 |
| 2/2025 | MATIX CONSTRUTORA LTDA (Urbanização, Praças e In) | 904.000,00 | 445.915,50 | 49,33 | 25% | Sim | 1.480.733,33 | 1.480.733,33 |
| 51/2025 | RENOVA CONSTRUCOES E REFORMA (Urbanização, Praças e In) | 2.864.000,00 | 1.384.783,45 | 48,35 | 50% | Não | 3.862.534,90 | 1.855.549,35 |
| 141/2025 | RENOVA CONSTRUCOES E REFORMA (Reforma Elétrica e Clima) | 558.208,00 | 246.938,61 | 44,24 | 50% | Não | 808.283,25 | 586.823,14 |
| 78/2025 | M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGEN (Construção, Reforma e Am) | 1.198.292,00 | 376.845,76 | 31,45 | 50% | Não | 1.659.195,28 | 1.659.195,28 |
| 375/2025 | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MON (Manutenção e Conservação) | 400.000,00 | 100.000,00 | 25,00 | 25% | Não | - | - |
| 309/2025 | AMF ENGENHARIA E SERVICOS LT (Urbanização, Praças e In) | 684.831,30 | 170.828,61 | 24,94 | 25% | Não | 846.703,75 | 846.703,75 |
| 25/2025 | METAL EDIFICACOES E ESTRUTUR (Urbanização, Praças e In) | 1.499.000,00 | 373.817,66 | 24,94 | 25% | Não | 2.018.979,03 | 2.018.979,03 |
| 474/2025 | SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PR (Contenção de Encostas e ) | 2.403.760,64 | 590.881,77 | 24,58 | 25% | Não | 2.238.662,40 | 2.238.662,40 |
| 47/2026 | M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGEN (Reconstrução e Melhorias) | 6.237.395,15 | 1.470.524,90 | 23,58 | 25% | Não | 1.462.469,06 | 205.962,89 |

**Mapeamento por Subcategoria do Objeto (101 contratos classificados como Obra):**

| Subcategoria do Objeto | n | Valor Inicial | Aditivos | Var. % | Com adit. | Empenhado (Painel) | Pago (Painel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Públicos | 19 | 195.466.591,48 | 1.453.183,14 | 0,74 | 3 | 40.658.952,72 | 23.632.815,90 |
| Urbanização, Praças e Infraestrutura Viária | 19 | 140.765.062,19 | 3.685.778,06 | 2,62 | 7 | 26.396.689,76 | 16.359.013,41 |
| Projetos, Estudos e Consultoria de Engenharia | 15 | 10.489.073,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |

| Subcategoria do Objeto | n | Valor Inicial | Aditivos | Var. % | Com adit. | Empenhado (Painel) | Pago (Painel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalações, Tecnologia, Elevadores e Iluminação | 13 | 21.538.928,45 | 2.580.681,13 | 11,98 | 5 | - | - |
| Manutenção e Conservação Predial | 10 | 65.658.479,10 | 3.905.622,32 | 5,95 | 2 | - | - |
| Reforma Elétrica e Climatização Predial | 7 | 9.612.781,83 | 246.938,61 | 2,57 | 1 | 6.942.274,14 | 4.947.689,99 |
| Contenção de Encostas e Drenagem | 5 | 19.675.977,92 | 2.289.367,62 | 11,64 | 2 | 18.010.135,32 | 13.252.729,48 |
| Manutenção de Vias, Calçadas e Drenagem | 5 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| Outros Serviços Cadastrados como Obra (Poda, Resíduos, Eventos) | 4 | 1.374.331,13 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| Reconstrução e Melhorias Habitacionais | 4 | 36.407.300,41 | 0,00 | 0,00 | 1 | 7.719.830,80 | 3.627.423,71 |


## 5. Discrepâncias matemáticas e cruzamento com o Painel de Obras

| Verificação | Resultado |
|---|---|
| Valor contratado + aditivo diferente de valor total (tolerância R$ 0,01) | 0 contratos |
| Valor contratado menor ou igual a zero | 15 contratos |
| Aditivo maior que o valor contratado (> 100%) | 45 contratos |
| Obras (2025-2026) localizadas no Painel de Obras da PMV | 40 de 101 obras (Empenhado: R$ 99.727.882,74 \| Pago: R$ 61.819.672,49) |
| Obras em que o Valor Empenhado supera o Valor Total (Inicial + Aditivo) | 14 obras |
| Valor inicial PMV igual ao TCE-ES (contratos casados) | 643 de 643 |
| Aditivo > 0 na PMV e nenhum termo no TCE-ES (contratos casados) | 9 contratos |

## 6. Licitação (PNCP) e contrato

Desconto da licitação = (valor estimado - valor homologado) / valor estimado.

| Grupo | n | Média % | Mediana % | Desvio % | Mín % | Máx % | Contr. > homolog. | Atual > homolog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 720 | 10,47 | 0,00 | 22,76 | -125,00 | 93,01 | 3 | 32 |
| Obras | 34 | 12,58 | 4,62 | 14,03 | 0,00 | 43,72 | 0 | 4 |

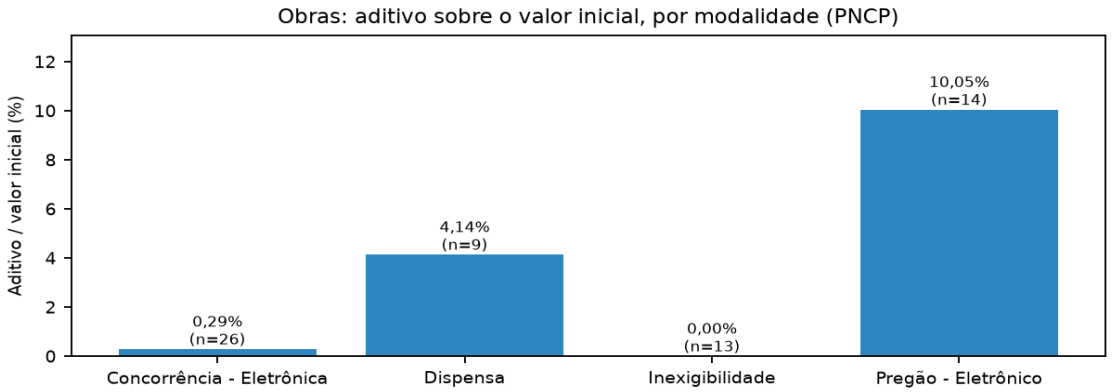



| Modalidade (todos, sem outlier) | n | Valor inicial | Aditivo | Aditivo/inicial % | Com aditivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 28 | 158.483.746,92 | 452.959,01 | 0,29 | 3 |
| Dispensa | 94 | 54.343.376,06 | 2.625.731,66 | 4,83 | 15 |
| Inexigibilidade | 431 | 47.315.925,43 | 13.311.121,98 | 28,13 | 14 |
| Pregão - Eletrônico | 238 | 237.770.157,03 | 10.999.943,71 | 4,63 | 34 |
| Pregão - Presencial | 2 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

## 7. Termos e pagamentos (TCE-ES, apenas contratos casados)

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Contratos com termo de alteração | 57 |
| Termos aditivos / apostilamentos | 51 / 20 |
| Prorrogações de prazo | 26 |
| Acréscimos ou supressões quantitativas | 11 |
| Reequilíbrios econômico-financeiros | 7 |
| Contratos com pagamento registrado no TCE-ES / total pago (R$) | 245 / 55.563.054,66 |

## 8. Aditivos por secretaria / entidade

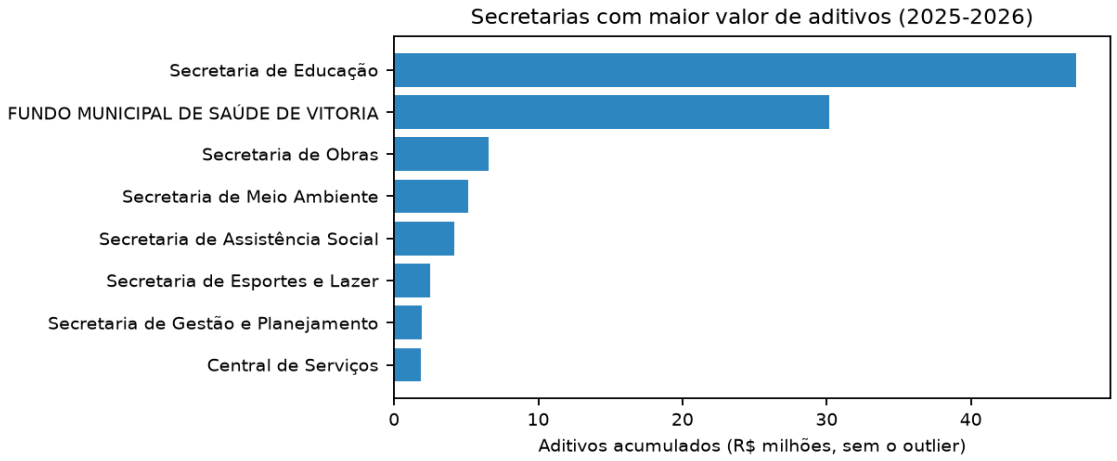


| Secretaria / Entidade (sem outlier) | n | Valor inicial | Aditivo | Aditivo/inicial % | Com aditivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Educação | 43 | 123.790.944,68 | 47.284.794,27 | 38,20 | 17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA | 107 | 151.642.825,51 | 30.165.127,78 | 19,89 | 30 |
| Secretaria de Obras | 59 | 352.922.215,29 | 6.554.812,01 | 1,86 | 14 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 15 | 19.655.922,26 | 5.115.932,81 | 26,03 | 4 |
| Secretaria de Assistência Social | 18 | 6.582.823,31 | 4.198.038,06 | 63,77 | 5 |
| Secretaria de Esportes e Lazer | 32 | 5.885.148,27 | 2.507.504,07 | 42,61 | 7 |
| Secretaria de Gestão e Planejamento | 50 | 19.126.072,86 | 1.906.334,21 | 9,97 | 9 |
| Central de Serviços | 27 | 66.523.009,43 | 1.828.691,90 | 2,75 | 2 |
| Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Ur | 17 | 36.663.644,77 | 1.706.530,48 | 4,65 | 3 |
| Secretaria de Cultura | 350 | 20.330.328,46 | 1.376.357,91 | 6,77 | 5 |
| Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação | 32 | 7.731.255,01 | 1.191.683,18 | 15,41 | 3 |
| Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho | 36 | 3.752.870,68 | 881.597,98 | 23,49 | 6 |

## 9. Limitações

• O Painel de Obras da PMV traz Valor Empenhado, Liquidado e Pago para 40 das 101 obras de 2025-2026 (e mais 139 obras de 2021-2024 salvas em painel_obras_pmv_2021_2026.csv).

• Obras = campo TipoContrato 'Obra' da própria base. Há itens de tecnologia, manutenção e eventos nessa classificação (mapeados na Subcategoria do Objeto).

• Reforma identificada pelo campo do TCE-ES ou pela palavra 'reforma' no objeto; pode haver erros.

• O limite de 25% foi aplicado apenas às obras. Serviços contínuos têm regras próprias.

## 10. Recorrência de empresas nos contratos de obras (2025–2026)

Nos 101 contratos classificados como Obra, atuam 57 empresas distintas, sendo 21 empresas recorrentes (2 ou mais contratos), que concentram 65 contratos:

| Pos. | Fornecedor | CNPJ | Contratos | C/ adit. | > Lim. | Valor inicial | Aditivo | Valor atual | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS L | 05.035.581/0001-10 | 10 | 3 (30%) | 2 | 18.543.999,29 | 5.383.967,04 | 23.927.966,33 | 29,03 % |
| 2º | M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | 09.442.585/0001-74 | 7 | 3 (43%) | 0 | 25.740.429,41 | 412.037,55 | 26.152.466,96 | 1,60% |
| 3º | ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 04.405.032/0001-28 | 6 | 1 (17%) | 0 | 41.821.028,19 | 638.931,42 | 42.459.959,61 | 1,53% |
| 4º | SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS D | 42.418.533/0001-38 | 3 | 2 (67%) | 0 | 13.911.102,30 | 2.289.367,62 | 16.200.469,92 | 16,46 % |
| 5º | RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 25.309.819/0001-66 | 3 | 3 (100%) | 0 | 6.922.208,00 | 2.069.128,02 | 8.991.336,02 | 29,89 % |
| 6º | SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP | 36.313.112/0001-40 | 3 | 0 (0%) | 0 | 5.722.775,59 | 0,00 | 5.722.775,59 | 0,00% |
| 7º | MATIX CONSTRUTORA LTDA | 19.478.201/0001-27 | 3 | 1 (33%) | 1 | 4.294.000,00 | 445.915,50 | 4.739.915,50 | 10,38 % |
| 8º | ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO | 04.139.058/0001-71 | 3 | 0 (0%) | 0 | 561.887,53 | 0,00 | 561.887,53 | 0,00% |
| 9º | NOS ARQUITETOS LTDA | 22.335.648/0001-51 | 3 | 0 (0%) | 0 | 145.045,34 | 0,00 | 145.045,34 | 0,00% |
| 10º | VILLA CONSTRUTORA LTDA | 02.394.085/0001-65 | 2 | 0 (0%) | 0 | 22.461.985,21 | 0,00 | 22.461.985,21 | 0,00% |
| 11º | ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 11.311.377/0001-88 | 2 | 0 (0%) | 0 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00% |
| 12º | DUTO ENGENHARIA LTDA | 27.557.792/0001-56 | 2 | 0 (0%) | 0 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00% |
| 13º | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOL | 02.980.103/0001-90 | 2 | 0 (0%) | 0 | 9.347.093,00 | 0,00 | 9.347.093,00 | 0,00% |
| 14º | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 11.452.317/0001-85 | 2 | 1 (50%) | 0 | 4.091.973,83 | 84.258,99 | 4.176.232,82 | 2,06% |
| 15º | METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METAL | 15.918.222/0001-65 | 2 | 1 (50%) | 0 | 3.446.000,00 | 373.817,66 | 3.819.817,66 | 10,85 % |

## 11. Telas do Painel Interativo Web (Dashboard Publicado)

Link público do painel interativo: https://leobmt02.github.io/tcc-auditoria-obras-vitoria/

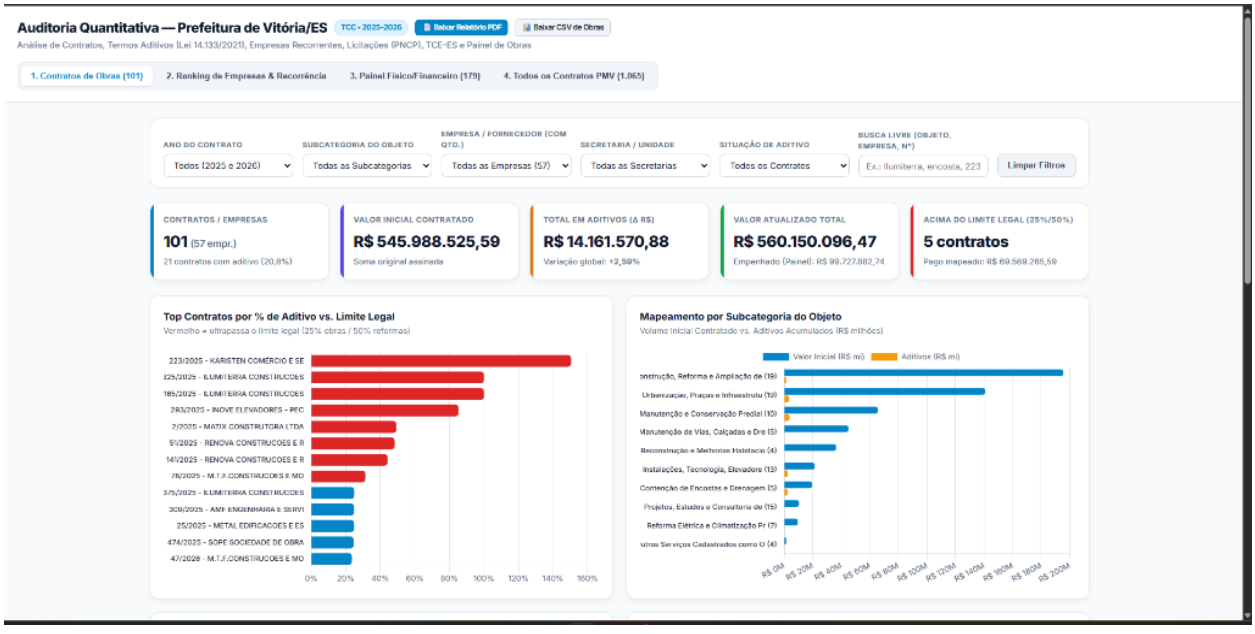



Figura A — Aba 1: Contratos de Obras (101) — Subcategorias, limites legais (25%/50%) e filtros.

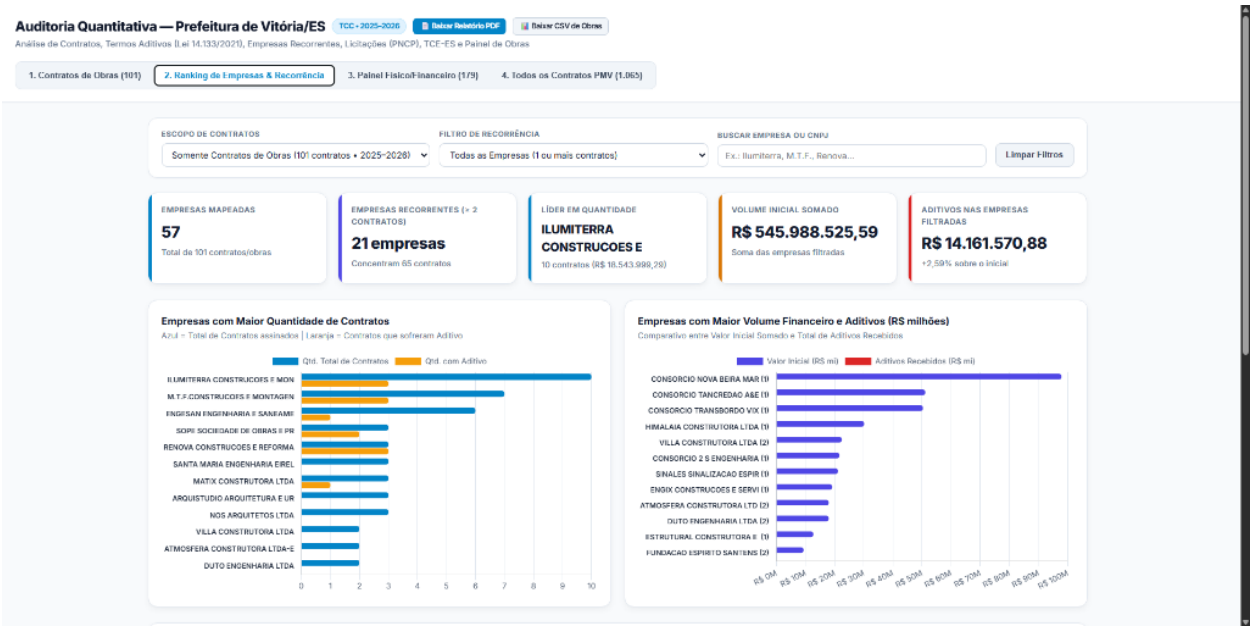



Figura B — Aba 2: Ranking de Empresas e Recorrência — Quantidade de contratos e proporção de aditivos.

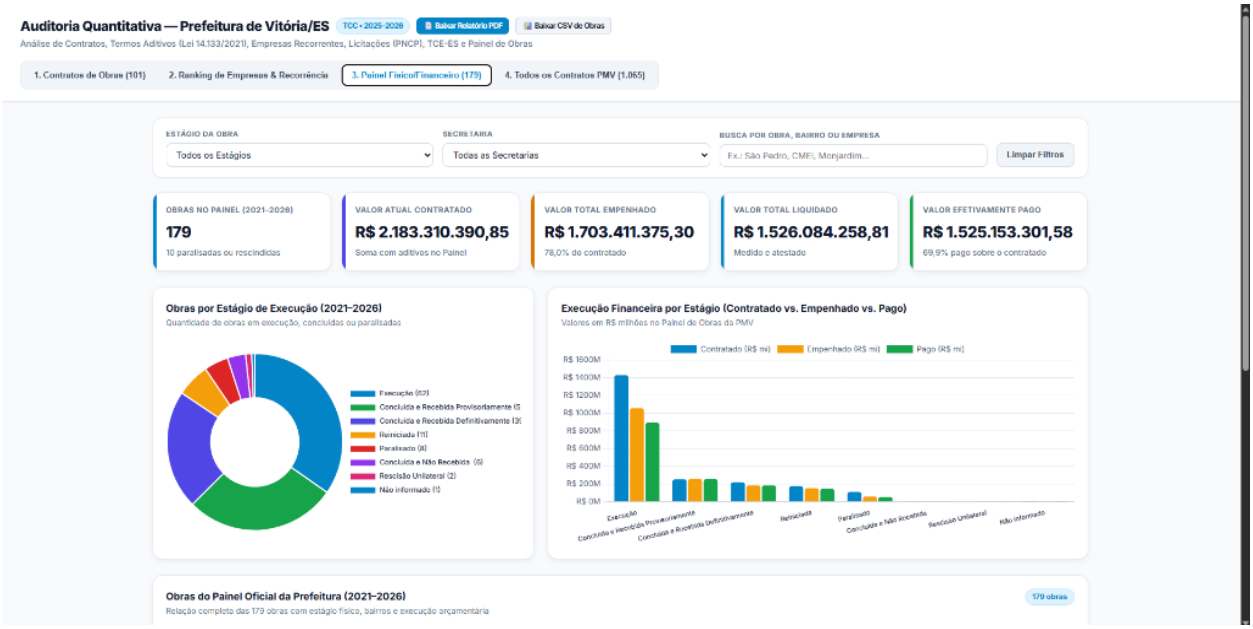



Figura C — Aba 3: Painel Físico/Financeiro (179 obras, 2021–2026) — Contratado, Empenhado, Liquidado e Pago.

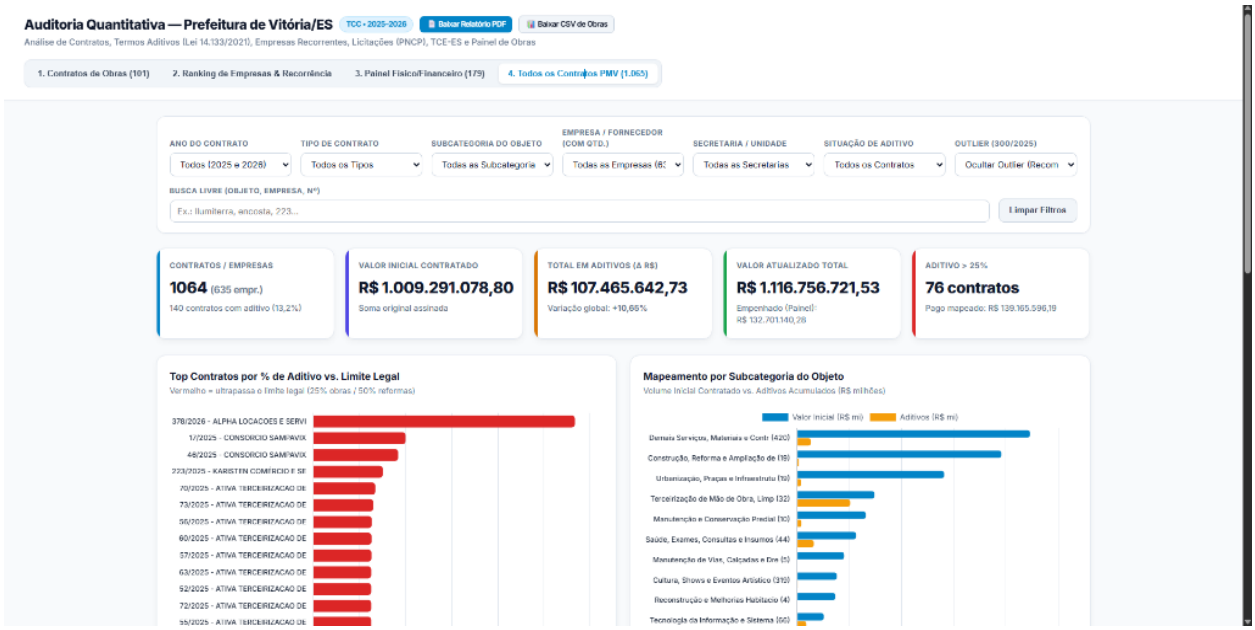



Figura D — Aba 4: Todos os Contratos PMV (1.065) — Visão com e sem outlier 300/2025.
